


Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt


bis 19.10.2023

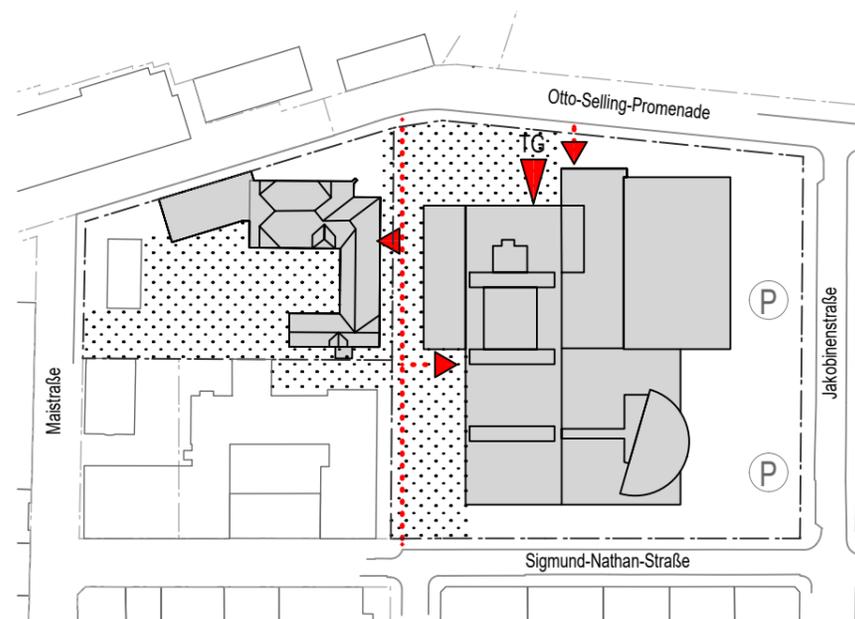

Bestand

20.10.2023 - 06.03.2024

Phase 5,0 Monate  
 Gesamt 5,0 Monate

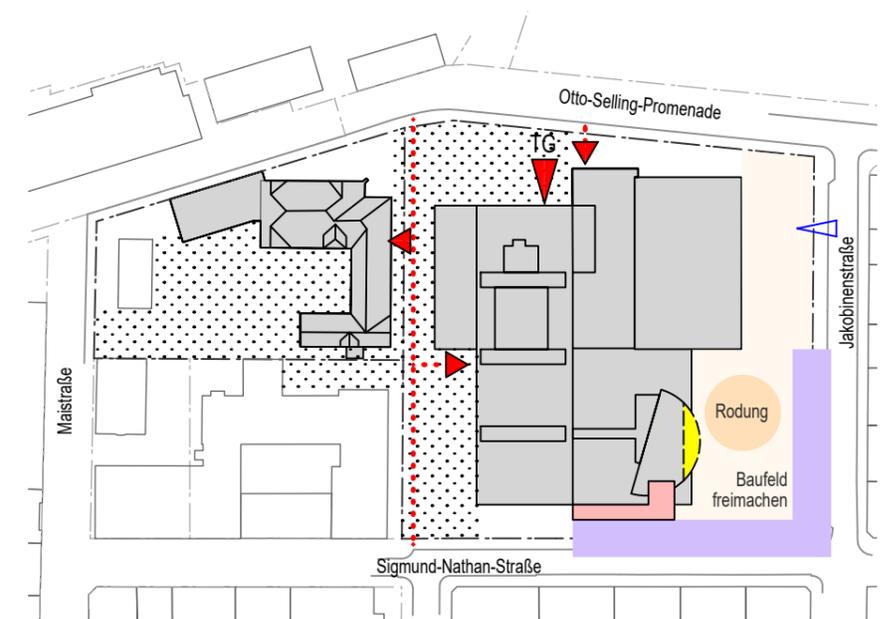


1. Phase

- Rodungsarbeiten, Bäume fällen
- Spartenverlegung
- Baufeldfreimachung BA1
- Teilabbruch Ufo
- Umbau Rettungsweg Bestand

06.03.2024 - 15.11.2024

Phase 8,0 Monate  
 Gesamt 13,0 Monate

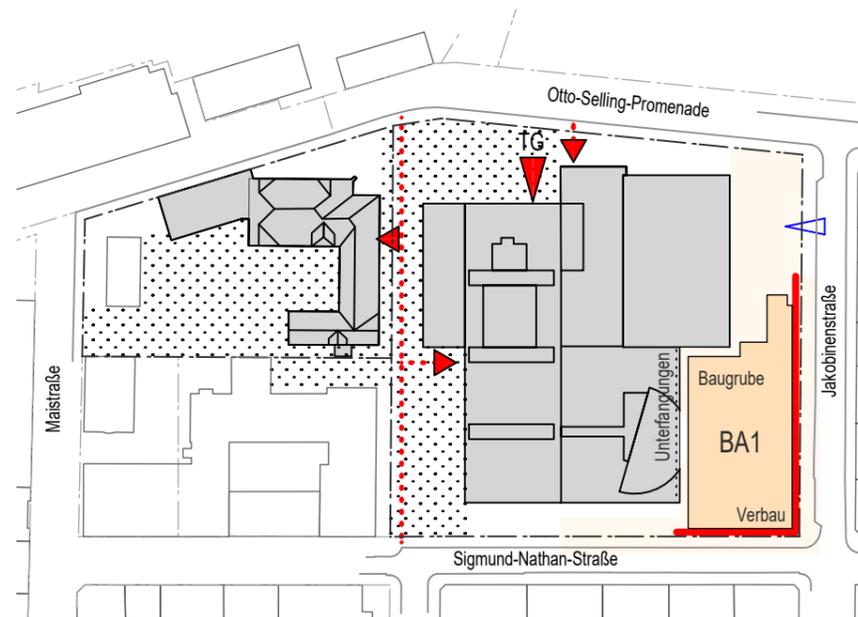


2. Phase

- Verbauarbeiten
- Unterfangungen Bestand
- Baugrube BA1 herstellen

18.11.2024 - 12.09.2025

Phase 10,0 Monate  
 Gesamt 23,0 Monate

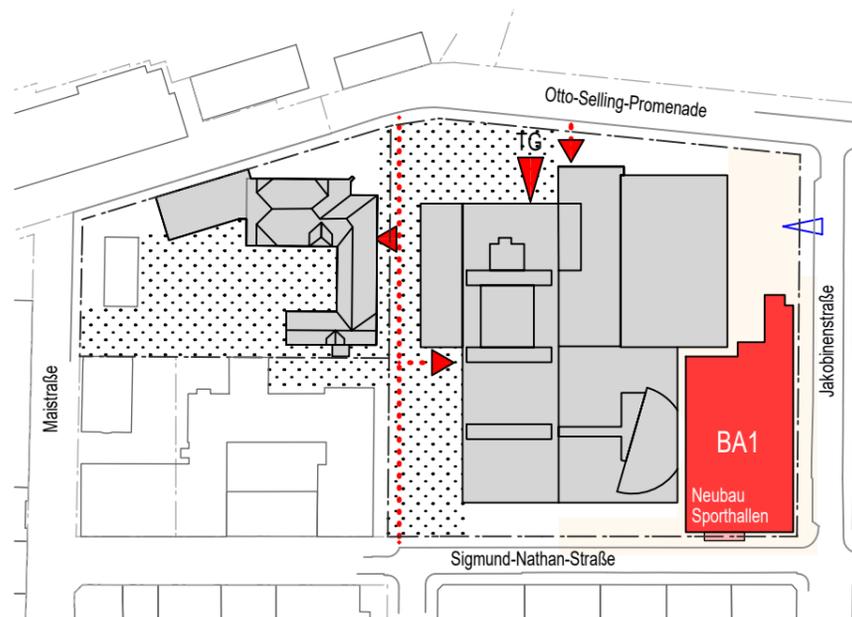


3. Phase

- Neubau BA1 Sporthalle  
 Rohbau, Fassade, Dach, Innenausbau
- Herstellen Interim

15.09.2025 - 12.02.2026

Phase 5,0 Monate  
 Gesamt 28,0 Monate

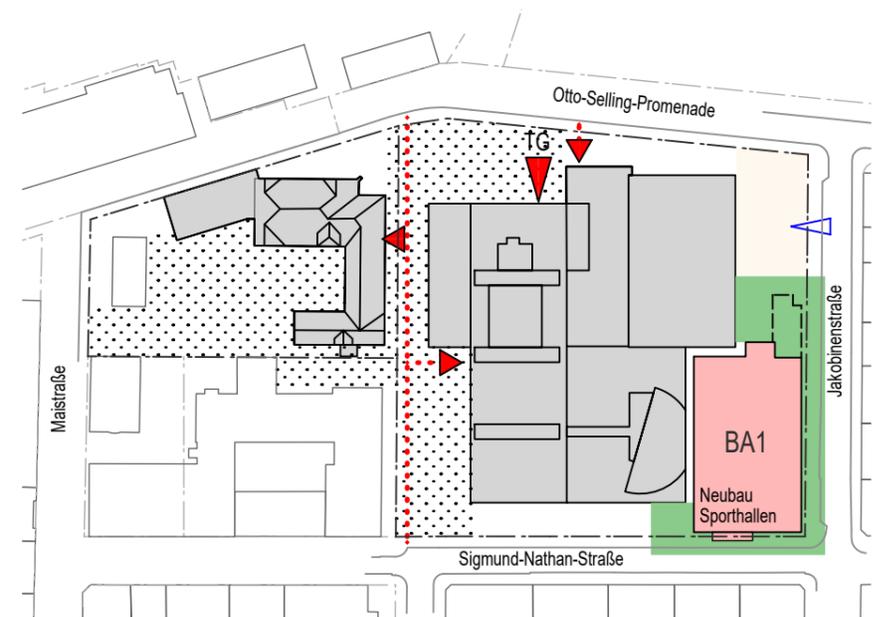


4. Phase

- Innenausbau BA1 Sporthalle fertigstellen
- Freianlagen Sporthalle herstellen

13.02.2026 - 03.04.2026

Phase 2,0 Monate  
 Gesamt 30,0 Monate

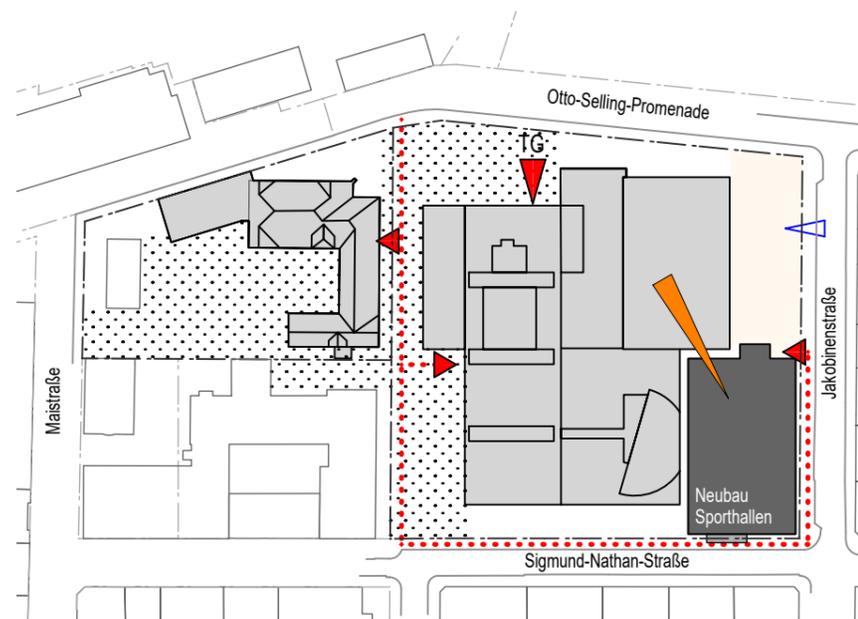


5. Phase

- Inbetriebnahme BA1 Sporthalle, Umzug

06.04.2024 - 24.07.2026

Phase 3,0 Monate  
 Gesamt 33,0 Monate

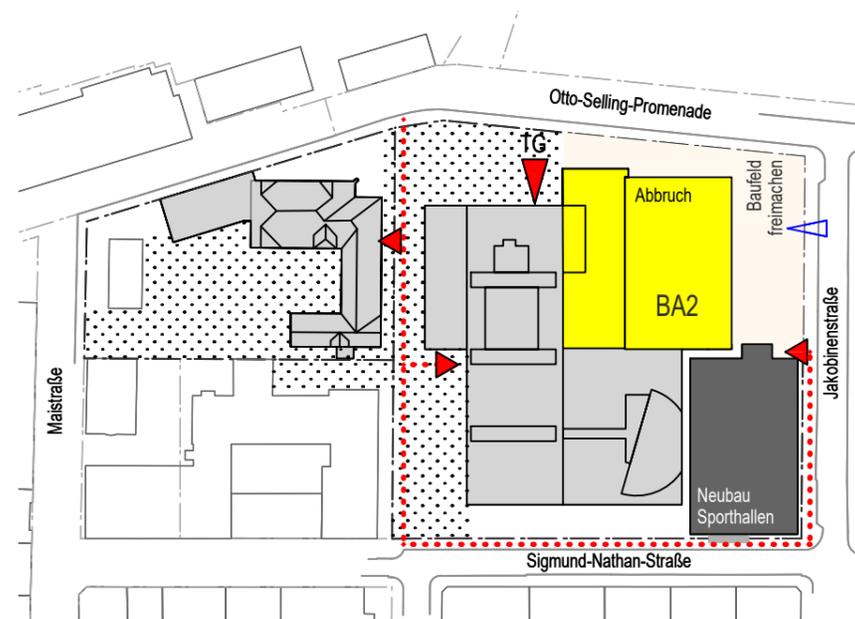


6. Phase

- Abbruch Bestand Sporthalle
- Baufeldfreimachung BA2
- Baugrube BA2 herstellen

27.07.2026 - 12.11.2027

Phase 16,0 Monate  
 Gesamt 49,0 Monate

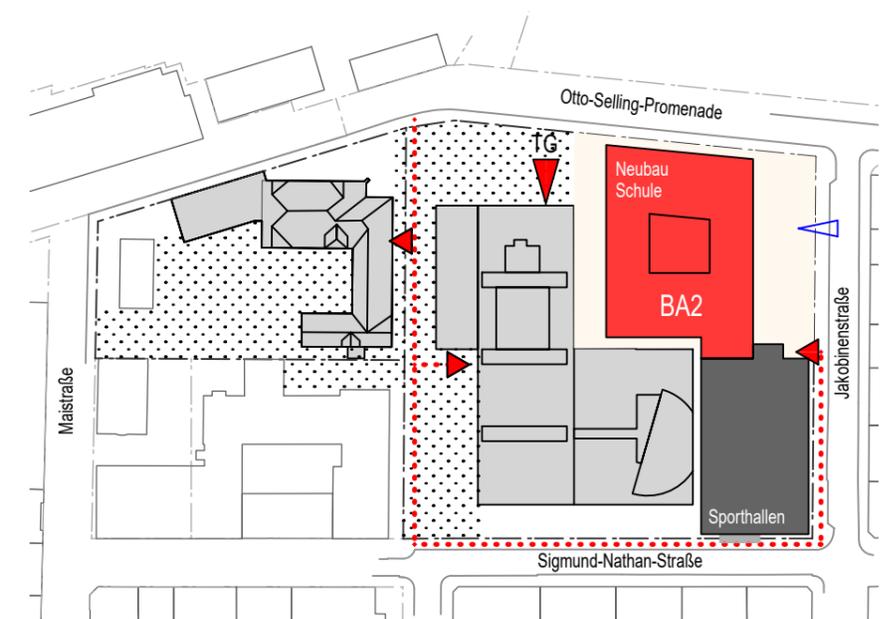


7. Phase

- Neubau BA2 Schule  
 Rohbau, Fassade, Dach, Innenausbau

15.11.2027 - 21.07.2028

Phase 8,0 Monate  
 Gesamt 57,0 Monate

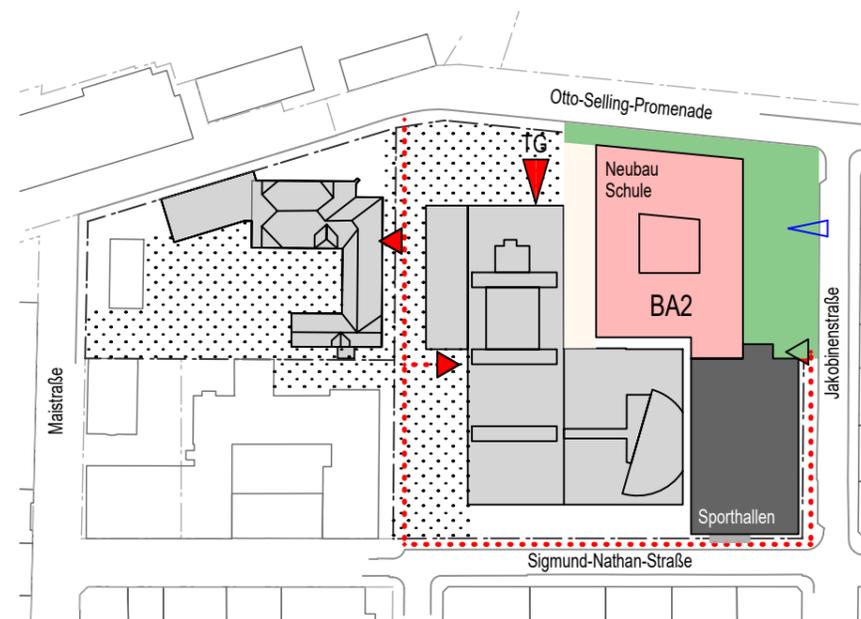


8. Phase

- Innenausbau BA2 Schule fertigstellen
- Freianlagen BA2 Schule herstellen

24.07.2028 - 11.09.2028

Phase 2,0 Monate  
 Gesamt 59,0 Monate

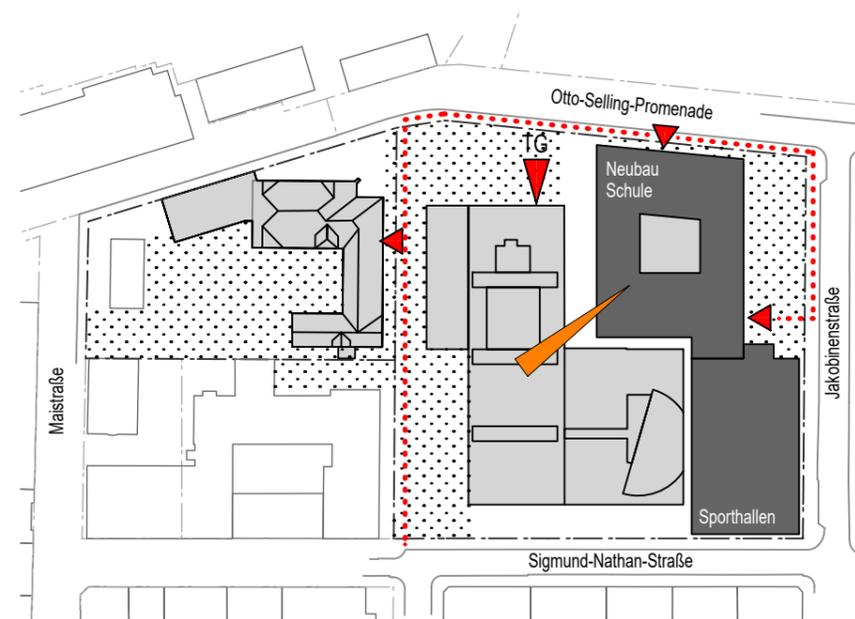


9. Phase

- Inbetriebnahme BA2 Schule, Umzug

12.09.2028 - 04.06.2029

Phase 9,0 Monate  
 Gesamt 68,0 Monate

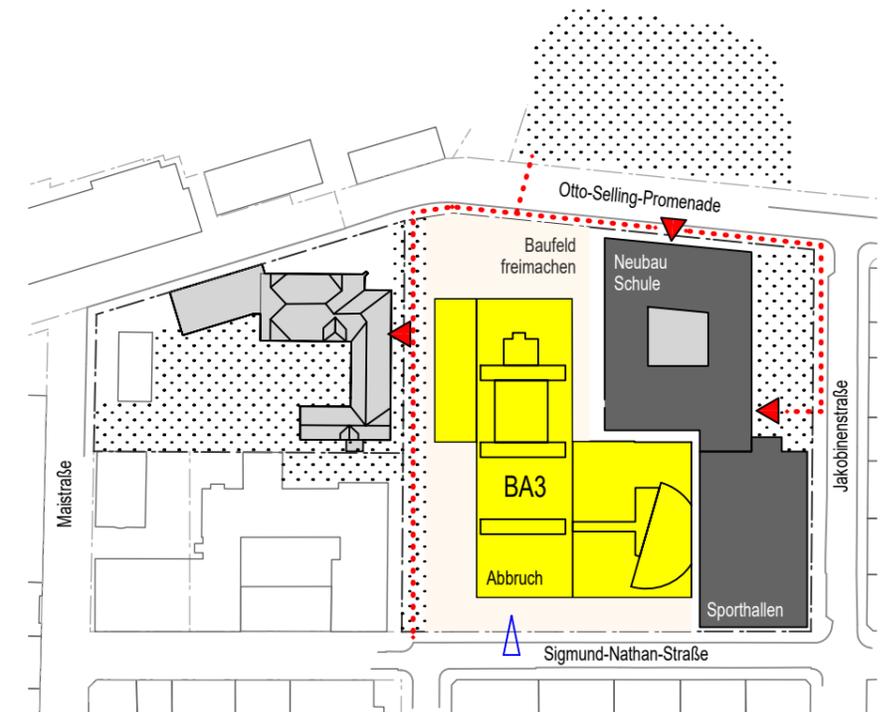


10. Phase

- Abbruch Bestand Schule
- Baufeldfreimachen BA3
- Baugrube BA3 herstellen

05.06.2029 - 15.11.2030

Phase 17,0 Monate  
 Gesamt 85,0 Monate

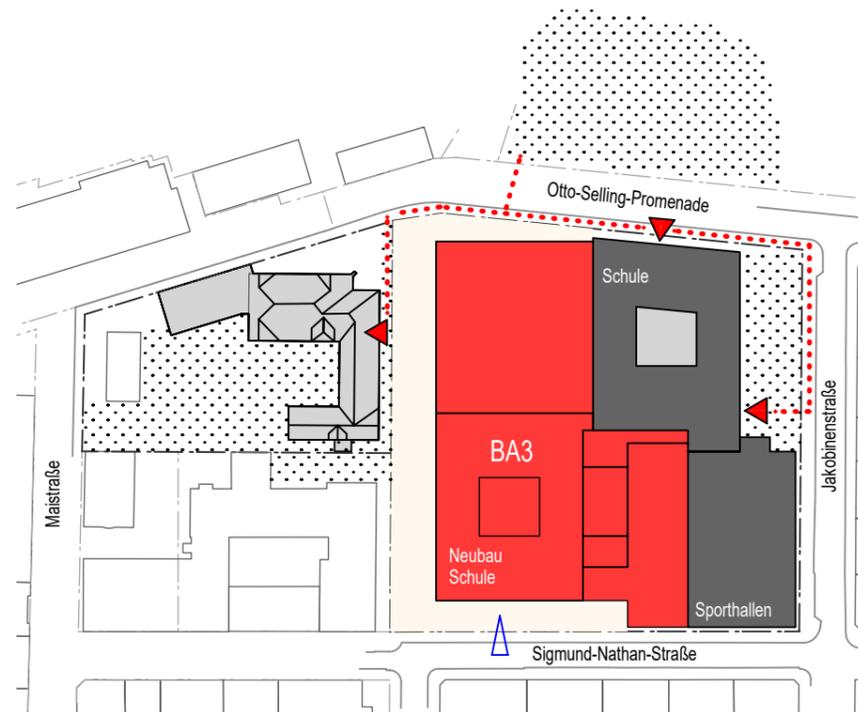


11. Phase

- Neubau BA3 Schule
- Rohbau, Fassade, Dach, Innenausbau

18.11.2030 - 18.07.2031

Phase 8,0 Monate  
 Gesamt 93,0 Monate

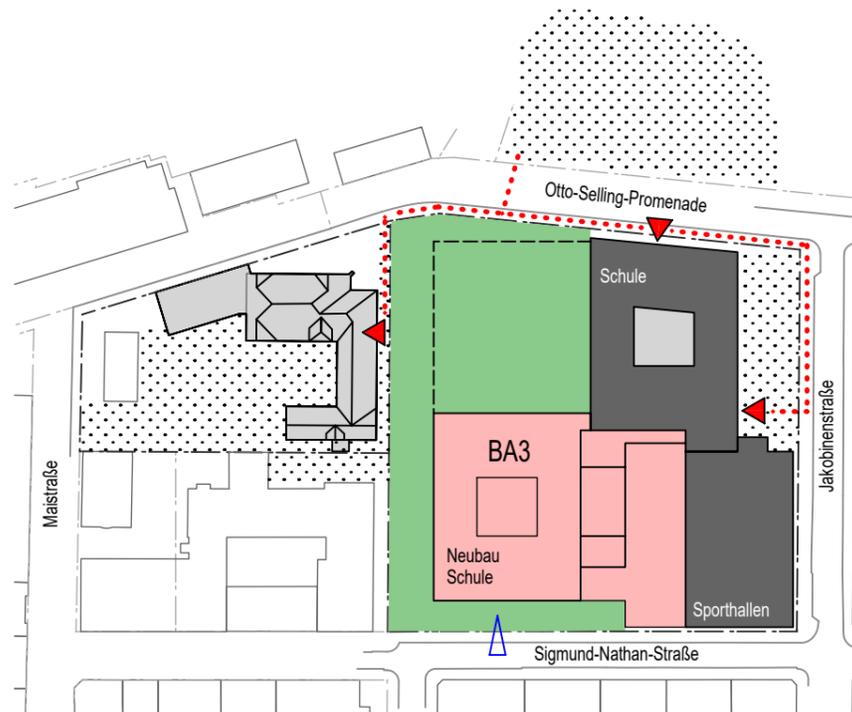


12. Phase

- Innenausbau BA3 Schule fertigstellen
- Freianlagen BA3 Schule herstellen

21.07.2031 - 08.09.2031

Phase 2,0 Monate  
 Gesamt 95,0 Monate

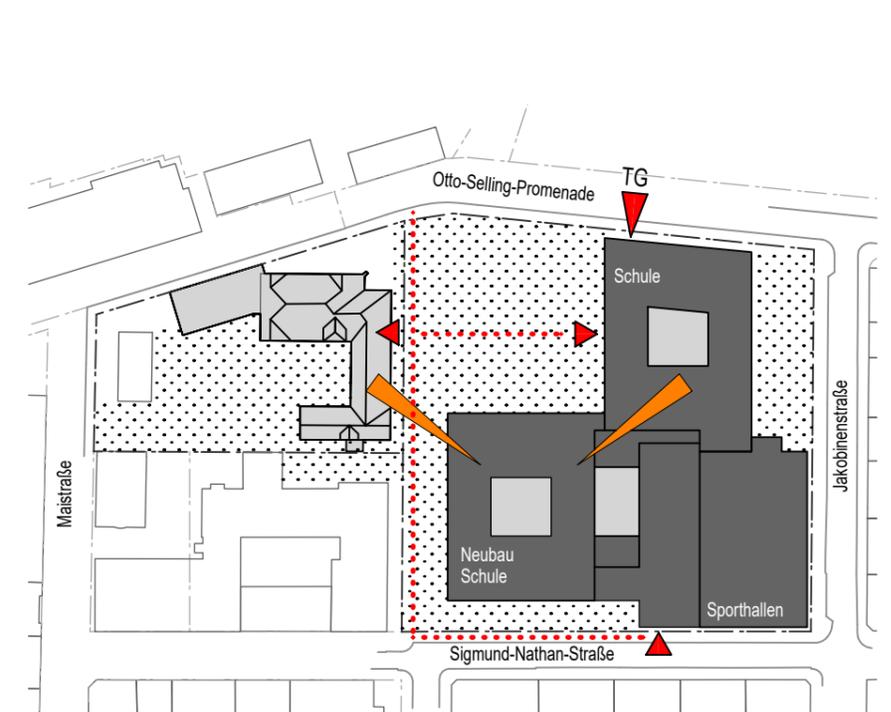

13. Phase


- Inbetriebnahme BA3 Schule, Umzug

HLG Helene-Lange-Gymnasium Fürth  
Bauphasen bei laufendem Betrieb  
Grobe Zeitplanung

Felix+Jonas Architekten GmbH  
Vorabzug 20.09.2021


09.09.2031 - 19.03.2032

Phase 6,0 Monate  
Gesamt 101,0 Monate

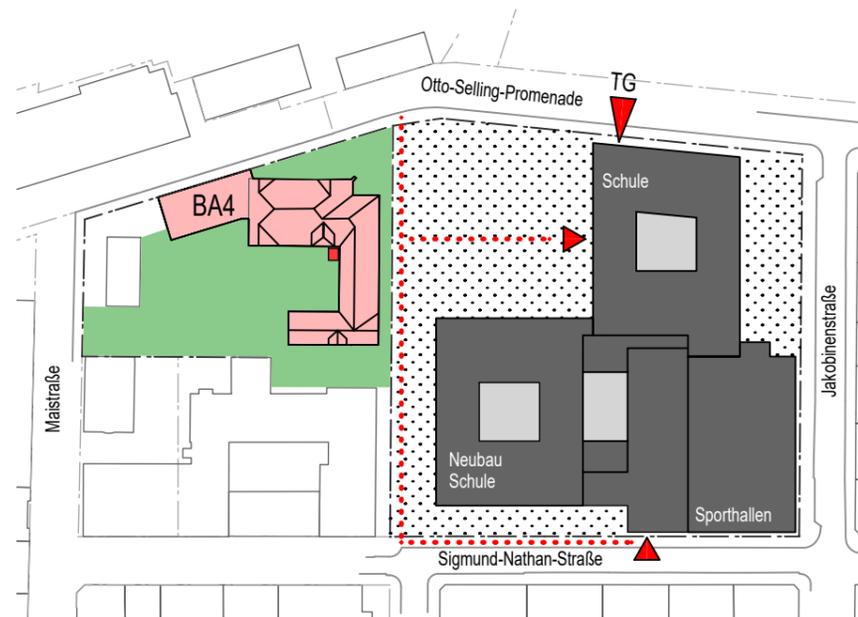

19.03.2032

Gesamt 101,0 Monate

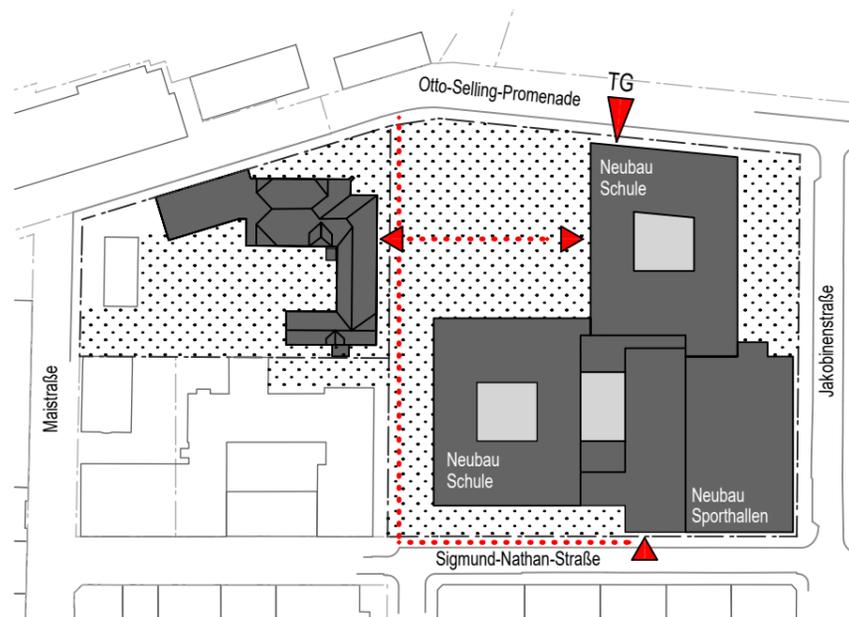

14. Phase

- Umbaumaßnahmen Altbau
- Freianlagen Altbau umgestalten

Gesamtfertigstellung
