P R O J E K T A B L A U F P L A N

Projekt:

Abwasseranlagen der Stadt Fürth - Nachklärung

Neubau von drei Nachklärbecken
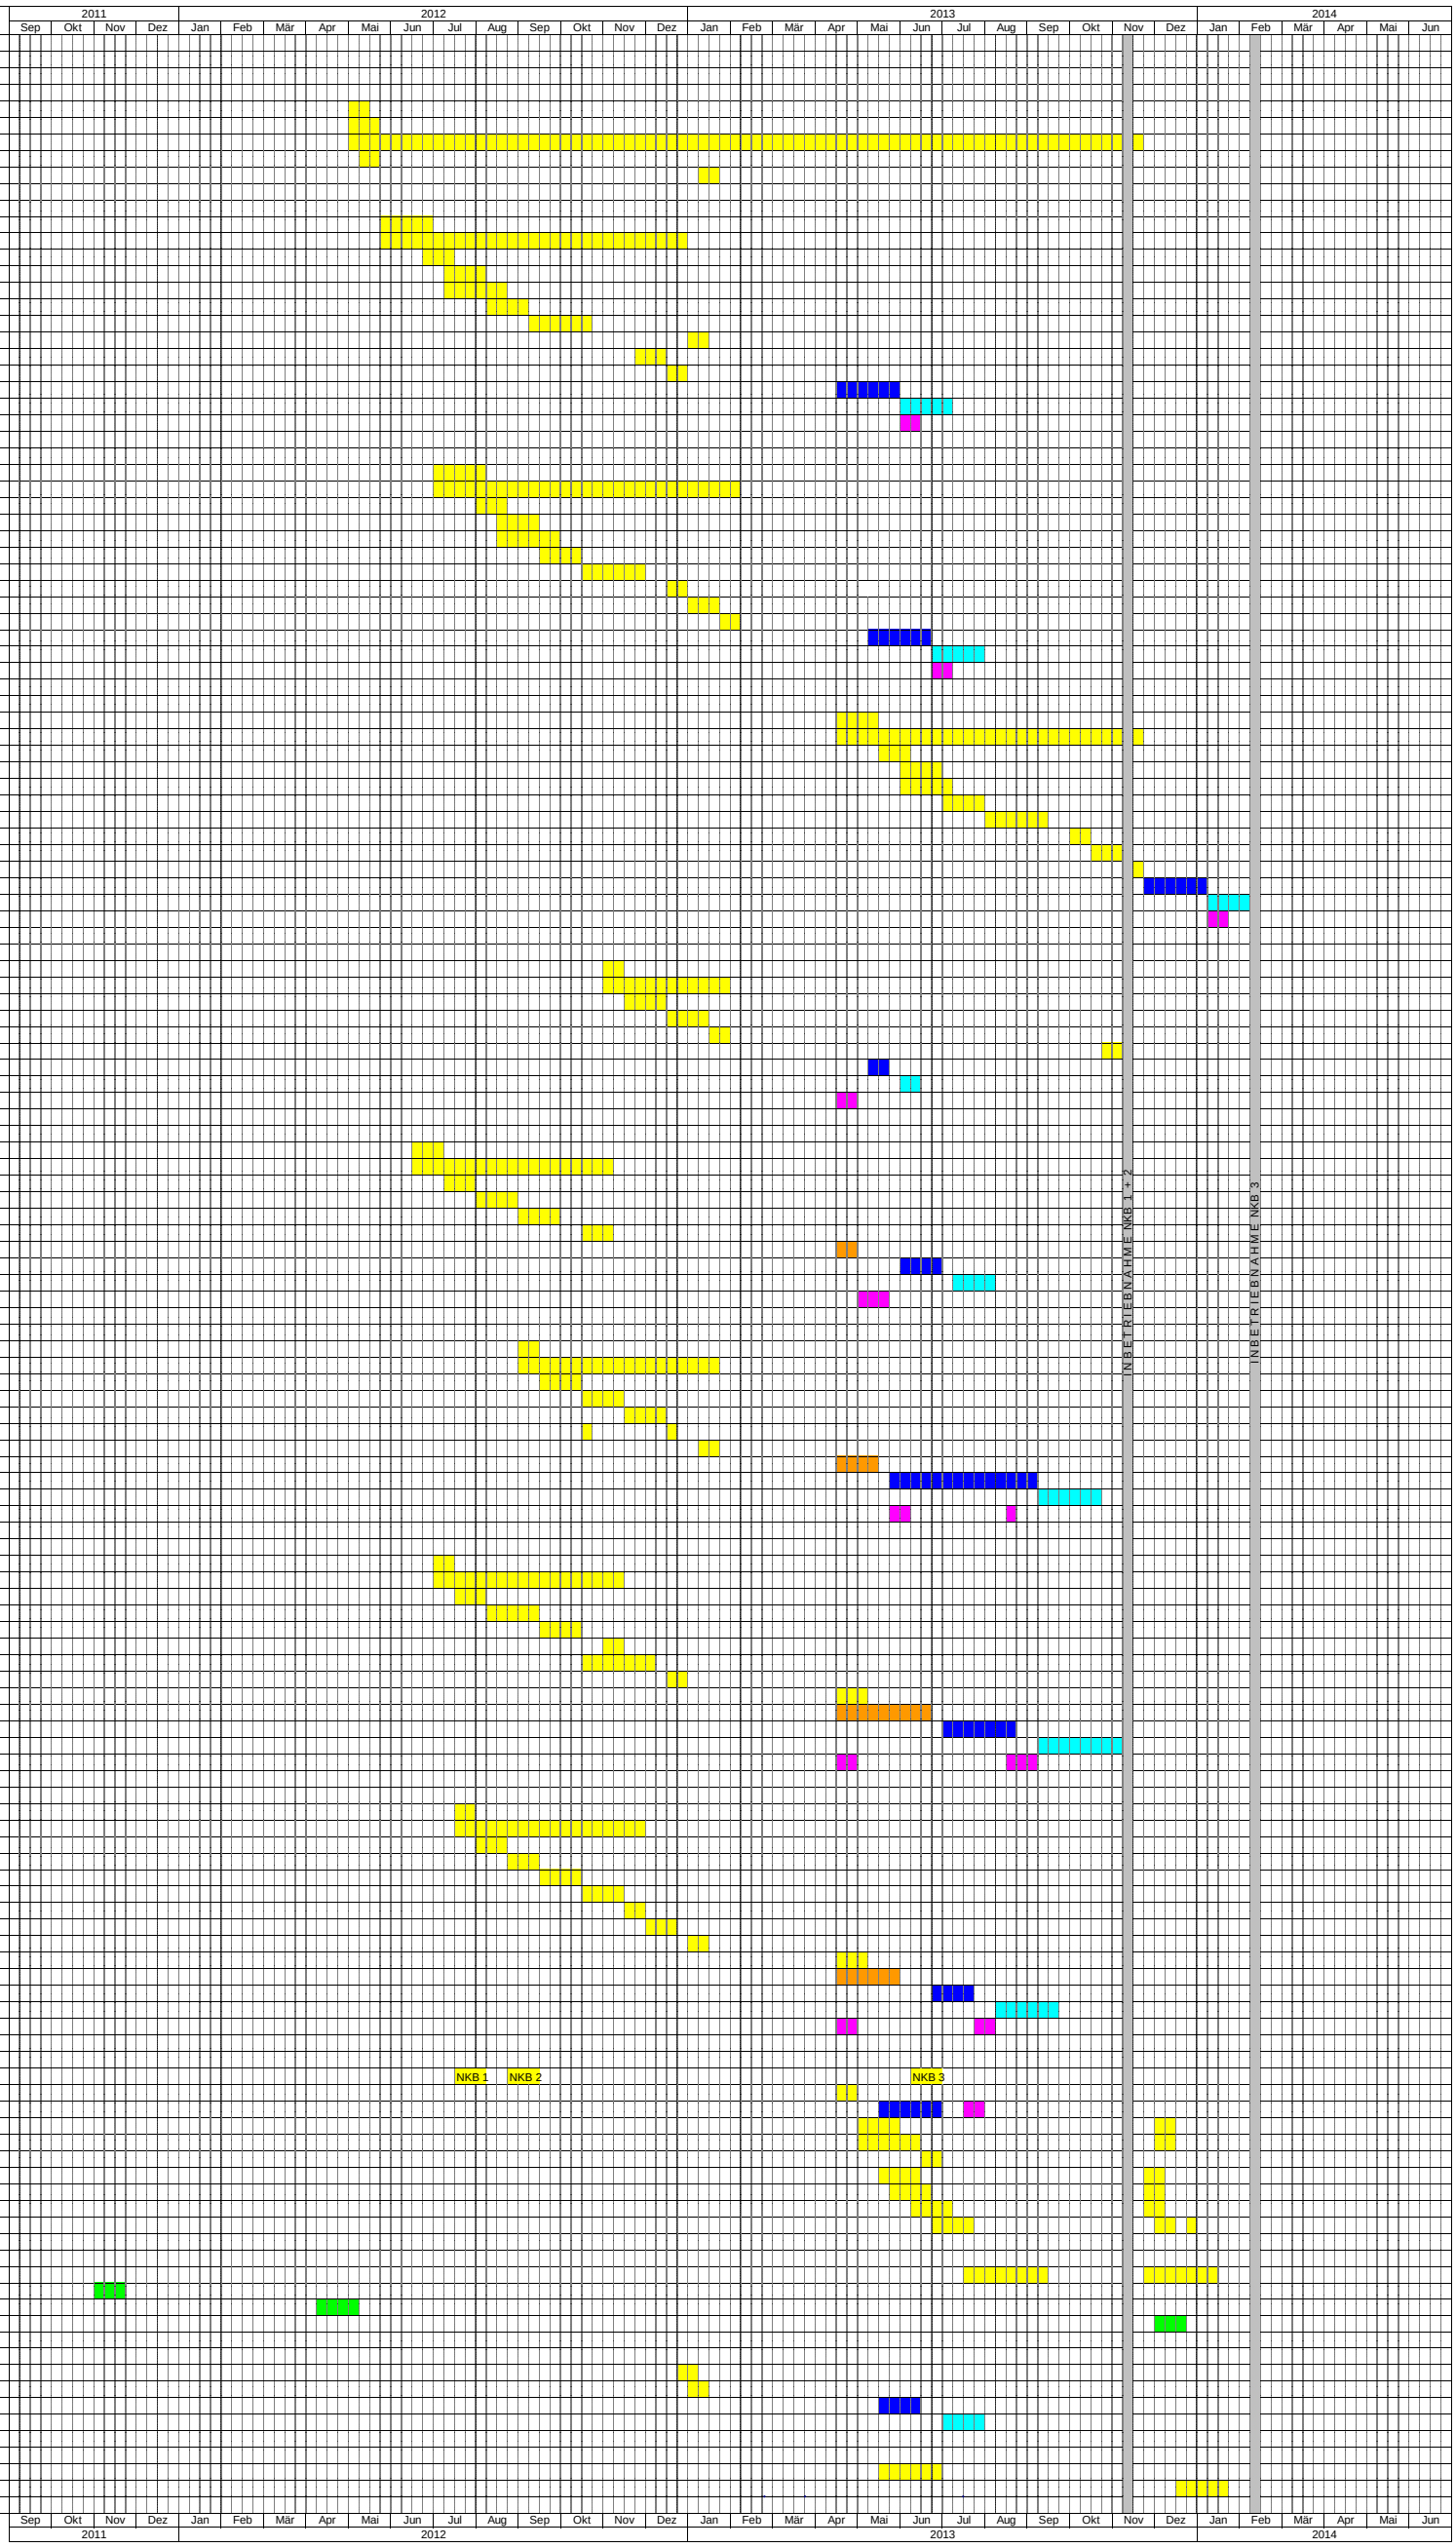
BA	Bezeichnung der Arbeiten
	Bauvorbereitungen
05	Baustelleneinrichtung
05	Baufeldfreimachung
05	Geschlossene Wasserhaltung
05	Horizontaldrain NKB 1 + 2
05	Horizontaldrain NKB 3
	Nachklärbecken 1
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Rohrleitungen unter Bodenplatte
05	Rückverankerung Bodenplatte
05	Trichter und Mittelbauwerk
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Wandkronenabdeckung
05	Dichtigkeitsprüfung
05	Bauwerkshinterfüllung
10/11	Maschinentechnische Ausrüstung Räumer + Ablaufkonstruktion
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Nachklärbecken 2
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Rohrleitungen unter Bodenplatte
05	Rückverankerung Bodenplatte
05	Trichter und Mittelbauwerk
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Wandkronenabdeckung
05	Dichtigkeitsprüfung
05	Bauwerkshinterfüllung
10/11	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Nachklärbecken 3
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Rohrleitungen unter Bodenplatte
05	Rückverankerung Bodenplatte
05	Trichter und Mittelbauwerk
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Wandkronenabdeckung
05	Dichtigkeitsprüfung
05	Bauwerkshinterfüllung
10/11	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Zulaufgerinne
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Bauwerkshinterfüllung
05	Anbindung an Ablaufrinne Belebung
12	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Verteilerbauwerk
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Decke
05	Hinterfüllung
05	Ausbauarbeiten
10/12	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Rohrkanal
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Decke
05	Anbindung an Bestand
05	Hinterfüllung
05	Ausbauarbeiten
12	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	RS-Schlammpumpwerk
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Decke
05	Hinterfüllung
05	Betonarbeiten Hochbau
05	Dach
05	Fertigteilfassade
05	Ausbauarbeiten
12	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Auslaufmessgebäude
05	Aushub
05	Ergänzende Wasserhaltung
05	Verbau einschl. Rückverankerung
05	Bodenplatte
05	Wände
05	Decke
05	Hinterfüllung
05	Betonarbeiten Hochbau
05	Dach
05	Fertigteilfassade
05	Ausbauarbeiten
12	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
--	Schlosserarbeiten
	Leitungen
05	Verbindungsleitungen NKBs Verteilerbauwerk
05	Druckleitung Rücklaufschlamm (erdverlegt)
05	Druckleitung Rücklaufschlamm (Bereich Belebung)
05	Druckleitungen Schwimmschlamm/Schmutzwasser (erdverlegt)
05	Ablaufleitung einschl. Schachtbauwerken
05	Einbindung Ablaufleitung in Schaumbekämpfungsschacht (Bestand)
05	Oberflächenentwässerung
05	Wasserleitung
05	Brauchwassernetz
05	Kabelleerrohrsystem
	Straßen und Wege, Außenanlagen
05	Straßen und Wege
--	Einzäunung
--	Sichtschutz
--	Bepflanzungen und Begrünung
	Phosphatfällung
05	Rohbau einschl. Hinterfüllung
05	Leitungssystem mit Kontrollschacht
12	Maschinentechnische Ausrüstung
20	Elektroinstallation
	Sonstiges
05	Fischteststeich
05	Außenanlagen, endgültige Böschungsausbildung etc.
