Rahmenterminplan
Verwaltungsgebäude Stadtentwässerung Fürth

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**Grundlagen**	**37 Tage**	**Fr 24.02.12**	**Mo 16.04.12**		
2	Auftrag Architekt	0 Tage	Fr 24.02.12	Fr 24.02.12		STEF
3	Bodengutachten	25 Tage	Fr 24.02.12	Do 29.03.12	2	
4	Abstimmung Raumprogramm	15 Tage	Di 27.03.12	Mo 16.04.12	2	STEF
5	**Vorentwurf**	**199 Tage**	**Di 17.04.12**	**Fr 01.02.13**		
6	Vorentwurf Vorabzug	20 Tage	Di 17.04.12	Mo 14.05.12	3;4	dp
7	Vorentwurf Geb.Tech	15 Tage	Di 08.05.12	Mo 28.05.12	6EA-5 Tage	GWF
8	Einarbeitung	10 Tage	Di 22.05.12	Mo 04.06.12	7EA-5 Tage	dp
9	Kostenschätzung	15 Tage	Di 29.05.12	Mo 18.06.12	8EA-5 Tage	Planer
10	Abstimmung AG	110 Tage	Di 19.06.12	Mo 19.11.12	9	STEF/dp
11	Vorstatik	20 Tage	Di 16.10.12	Mo 12.11.12		bhl
12	Freigabe Vorentwurf	0 Tage	Mo 14.01.13	Mo 14.01.13		STEF
13	Zusammenstellung	10 Tage	Mo 14.01.13	Fr 25.01.13	12	dp
14	Abstimmung Haustechnik	5 Tage	Mo 28.01.13	Fr 01.02.13	13	
15	**Entwurf**	**95 Tage**	**Mo 04.02.13**	**Fr 14.06.13**		
16	Entwurf Vorabzug	30 Tage	Mo 04.02.13	Fr 15.03.13	14	dp
17	Statische Angaben	20 Tage	Mo 04.03.13	Fr 29.03.13	16EA-10 Tage	bhl
18	haustechn. Angaben	20 Tage	Mo 04.03.13	Fr 29.03.13	17EE	GWF
19	Grunlagen ENEV	10 Tage	Mo 18.03.13	Fr 29.03.13	17EE	NN
20	Einarbeitung	5 Tage	Mo 01.04.13	Fr 05.04.13	17	dp
21	tragwerkspl,. Entwurf	25 Tage	Mo 01.04.13	Fr 03.05.13	20EA-5 Tage	NN
22	haustech. Entwurf	25 Tage	Mo 01.04.13	Fr 03.05.13	21EE	GWF
23	Kostenberechnung	15 Tage	Mo 15.04.13	Fr 03.05.13	22EA-15 Tage	Planer
24	Abstimmung AG	10 Tage	Mo 06.05.13	Fr 17.05.13	23	STEF/dp
25	Zusammenstellung	5 Tage	Mo 20.05.13	Fr 24.05.13	24	dp
26	Vorlage Bau u. Werkaussch.	5 Tage	Mo 27.05.13	Fr 31.05.13	25	
27	Maßnahmenbeschluss	0 Tage	Fr 14.06.13	Fr 14.06.13	26EA+10 Tage	
28	**Genehmigungsplanng**	**45 Tage**	**Mo 17.06.13**	**Fr 16.08.13**		
29	Brandschutzkonzept	10 Tage	Mo 17.06.13	Fr 28.06.13	16EA-10 Tage	dp
30	Genehmigungspläne	10 Tage	Mo 01.07.13	Fr 12.07.13	29	dp
31	Berechnungen	10 Tage	Mo 15.07.13	Fr 26.07.13	30	dp
32	Zusammenstellung	5 Tage	Mo 29.07.13	Fr 02.08.13	31	dp
33	Unterschriften	5 Tage	Mo 05.08.13	Fr 09.08.13	32	STEF
34	Einreichung	0 Tage	Fr 09.08.13	Fr 09.08.13	33	STEF
35	Enwässerungsgesuch	10 Tage	Mo 15.07.13	Fr 26.07.13	30	GWF
36	Eingabe Statik	30 Tage	Mo 08.07.13	Fr 16.08.13	30EA-5 Tage;2	NN
37	**Ausführungsplanung**	**162 Tage**	**Mo 15.07.13**	**Mi 12.03.14**		
38	Vorabzug Grundrisse	40 Tage	Mo 15.07.13	Fr 06.09.13	24EA-10 Tage	dp
39	SD Planung	30 Tage	Mo 02.09.13	Fr 11.10.13	38EA-5 Tage	GWF
40	Abstimmung SD Planung	30 Tage	Mo 16.09.13	Fr 25.10.13	39AA+10 Tage	Planer
41	Schnitte	42 Tage	Mo 09.09.13	Di 05.11.13	38	dp
42	Treppenhäuser	40 Tage	Mo 09.09.13	Fr 01.11.13	38	dp
43	Einarbeitung	30 Tage	Mo 30.09.13	Fr 08.11.13	40AA+10 Tage	dp
44	Freigabe Grundriss Arch	50 Tage	Mo 07.10.13	Mo 16.12.13	43AA+5 Tage	dp
45	Ansichten	30 Tage	Mi 06.11.13	Mi 18.12.13	41	dp
46	Ausführungspl. Statik	80 Tage	Mo 23.09.13	Mo 27.01.14	44AA-10 Tage	NN
47	Ausführungspl. Technik	60 Tage	Mo 14.10.13	Mo 20.01.14	39	GWF
48	Details	80 Tage	Mi 06.11.13	Mi 12.03.14	41	dp
49	**Ausschreibung**	**544 Tage**	**Do 09.02.12**	**Mi 09.04.14**		
50	Veröffentlichung	0 Tage	Do 09.02.12	Do 09.02.12		STEF
51	**Paket 1 erw. Rohbau**	**120 Tage**	**Mo 12.08.13**	**Mo 10.02.14**		
52	Erarbeitung	60 Tage	Mo 12.08.13	Fr 01.11.13	21;38EA-20 Ta	dp
53	Prüfung AG	5 Tage	Mo 04.11.13	Fr 08.11.13	52	STEF
54	Bieterfrist	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14		Bieter
55	Wertung	10 Tage	Di 28.01.14	Mo 10.02.14	54	dp
56	Auftrag	0 Tage	Mo 10.02.14	Mo 10.02.14	55	STEF
57	**Paket 2 Technik**	**65 Tage**	**Mo 28.10.13**	**Mo 10.02.14**		
58	Erarbeitung	30 Tage	Mo 28.10.13	Mo 09.12.13	47EA-50 Tage	GWF
59	Prüfung AG	5 Tage	Di 10.12.13	Mo 16.12.13	58	STEF
60	Bieterfrist	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14		Bieter
61	Wertung	10 Tage	Di 28.01.14	Mo 10.02.14	60	GWF
62	Auftrag	0 Tage	Mo 10.02.14	Mo 10.02.14	61	STEF
63	**Paket 3 Ausbau 1**	**60 Tage**	**Mo 04.11.13**	**Mo 10.02.14**		
64	Erarbeitung	30 Tage	Mo 04.11.13	Mo 16.12.13	45EA-40 Tage	dp
65	Prüfung AG	5 Tage	Di 17.12.13	Mo 23.12.13	64	STEF
66	Bieterfrist	15 Tage	Di 07.01.14	Mo 27.01.14		Bieter
67	Wertung	10 Tage	Di 28.01.14	Mo 10.02.14	66	dp
68	Auftrag	0 Tage	Mo 10.02.14	Mo 10.02.14	67	STEF
69	**Paket 4 Ausbau 2**	**60 Tage**	**Do 16.01.14**	**Mi 09.04.14**		
70	Erarbeitung	30 Tage	Do 16.01.14	Mi 26.02.14	48EA-40 Tage	dp
71	Prüfung AG	5 Tage	Do 27.02.14	Mi 05.03.14	70	STEF
72	Bieterfrist	15 Tage	Do 06.03.14	Mi 26.03.14	71	Bieter
73	Wertung	10 Tage	Do 27.03.14	Mi 09.04.14	72	dp
74	Auftrag	0 Tage	Mi 09.04.14	Mi 09.04.14	73	STEF
75	**Bauphase**	**425 Tage**	**Di 11.03.14**	**Mo 26.10.15**		
76	Erdaushub	15 Tage	Di 11.03.14	Mo 31.03.14	56EA+20 Tage	Bauuntern
77	Fundamante	25 Tage	Di 01.04.14	Mo 05.05.14	76	Bauuntern
78	Keller	35 Tage	Di 22.04.14	Mo 09.06.14	77EA-10 Tage	Bauuntern
79	EG	60 Tage	Di 27.05.14	Mo 18.08.14	78EA-10 Tage	Bauuntern
80	OG1	45 Tage	Di 22.07.14	Mo 22.09.14	79EA-20 Tage	Bauuntern
81	OG2	45 Tage	Di 09.09.14	Mo 10.11.14	80EA-10 Tage	Bauuntern
82	OG 3	30 Tage	Di 28.10.14	Mo 08.12.14	81EA-10 Tage	Bauuntern
83	Dach	40 Tage	Di 25.11.14	Mi 18.03.15	81EA+10 Tage	Dachdeciker
84	tech. Ausbau roh	80 Tage	Di 25.11.14	Mo 16.03.15	82EA-10 Tage	Haustech. Fa
85	Fassade	80 Tage	Di 09.12.14	Mo 30.03.15	82	Fensterbauer
86	baul. Ausbau	160 Tage	Di 03.03.15	Mo 12.10.15	85EA-20 Tage	Firmen
87	tech Ausbau fein	60 Tage	Di 21.07.15	Mo 12.10.15	86EE	Haustech. Fa
88	Abnahme	20 Tage	Di 29.09.15	Mo 26.10.15	87EA-10 Tage	STEF/dp
89	**Nachlauf**	**35 Tage**	**Di 13.10.15**	**Mo 30.11.15**		
90	Mängelbeseitigung	30 Tage	Di 13.10.15	Mo 23.11.15	88EA-10 Tage	Firmen
91	Inbetriebnahmne	15 Tage	Di 13.10.15	Mo 02.11.15	88EA-10 Tage	Firmen/STEF
92	Umzug	20 Tage	Di 03.11.15	Mo 30.11.15	91	STEF

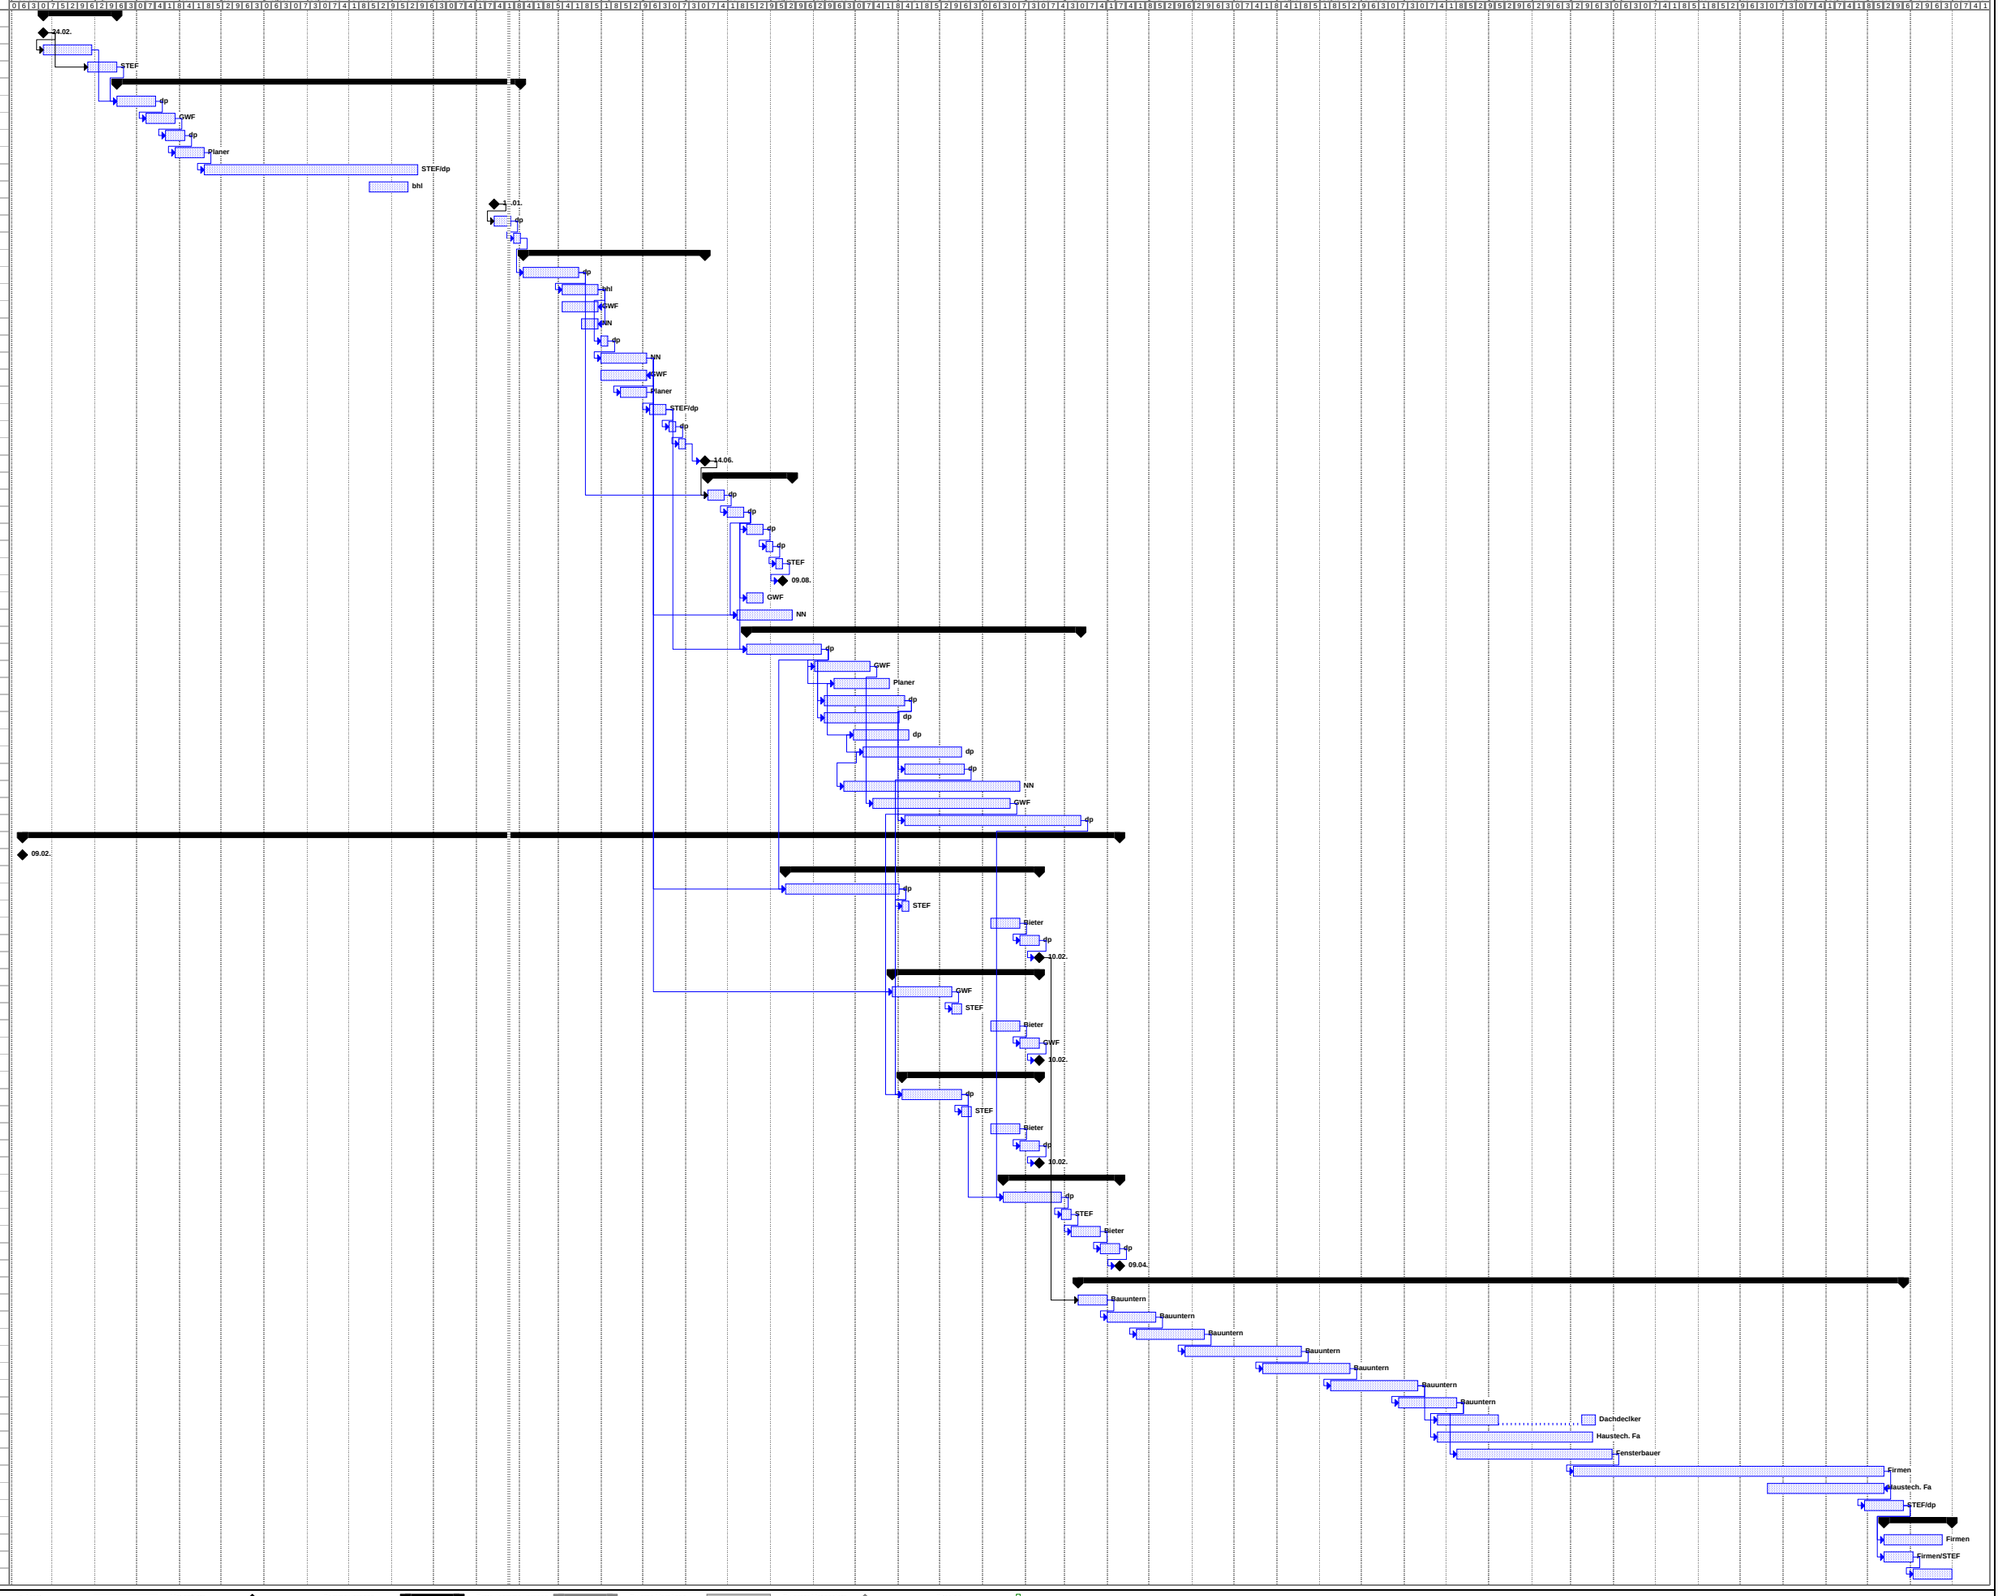

Projekt: 130124_Rahmenterminplan_V
Datum: Do 24.01.13

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag
